

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

SPRINT 3

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 3 es consolidar la gestión operática de la plataforma mediante la implementación del módulo de eventos y notificaciones, vinculándolos directamente con el sistema de reservas existente. Se priorizará la refinación de la interfaz mediante la refactorización a CSS Modules y el uso de variables globales para asegurar la consistencia visual y la accesibilidad. En el ámbito técnico, se fortalecerá la robustez del sistema con validaciones de conflictos de horario en el backend, la extensión de la persistencia de sesiones mediante JWT y la integración de herramientas de monitoreo de base de datos a través de Docker. Al final este sprint, la plataforma deberá ofrecer un flujo completo donde los usuarios puedan visualizar sus reservas con eventos asociados.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

Product Backlog

Mapeo o Flujo de Historias de Usuario

Autenticarse / Seguridad	→	Gestionar Eventos	→	Gestionar Espacios	→	Gestionar Reservas	→	Interfaz / Infraestructura
HU-24 Sesión activa		HU-13 Reservas con evento		HU-29 Disponibilidad por fecha y hora		HU-16 Validación de conflictos		HU-25 Página 404
HU-26 Sesión expirada		HU-18 Eventos específicos		HU-27 Liberación automática de salón		HU-17 Mis Reservas		HU-01 UI/UX general
HU-28 Registro autorizado				HU-14 Interfaz poco saturada				HU-00 Tablas, métricas y retroalimentación

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-24	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme.	Alta
HU-25	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404).	Media
HU-26	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado.	Alta
HU-27	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema.	Alta
HU-28	Como sacerdote o rol autorizado, quiero ser responsable del registro de personas dentro del sistema.	Alta
HU-29	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora.	Alta
HU-13	Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.	Alta
HU-18	Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.	Alta
HU-01	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema.	Media
HU-14	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos.	Media

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Tarea	Descripción	Prioridad
Corrección de schemas de eventos y notificaciones	Actualizar tablas de eventos y notificaciones para soportar nuevas funcionalidades del sistema.	Alta
Sistema de diseño global CSS	Definir variables visuales reutilizables para mantener consistencia UI/UX.	Media
Manejo de sesión expirada y JWT	Mejorar expiración de sesión y redirección automática al login.	Alta
Refactorización de formularios	Unificar estilos de formularios mediante CSS Modules.	Media
CRUD de eventos	Implementar endpoints REST para administración de eventos.	Alta
Integración de reservas con eventos	Crear automáticamente eventos asociados a reservas.	Alta
Página “Mis Reservas”	Mostrar reservas y eventos asociados al usuario autenticado.	Alta
Dashboard por rol	Mostrar contenido dinámico dependiendo del rol autenticado.	Alta
Restricción visual por roles	Ocultar botones y acciones según permisos del usuario.	Alta
Refactor módulo Reservas	Migrar estilos inline a CSS Modules.	Media
Endpoint de disponibilidad de espacios	Consultar disponibilidad de espacios según fecha y horario.	Alta

Refactor módulo Tareas y Ministros	Migrar vistas administrativas a CSS Modules.	Media
Refactor módulo Grupos	Refactorizar vistas de grupos utilizando CSS Modules.	Media
Validación de conflicto de horarios	Evitar reservas duplicadas mediante validación backend.	Alta
Página 404	Crear vista informativa para rutas inexistentes.	Media
Métricas y gráficas Sprint 3	Elaborar métricas y burndown chart del sprint.	Baja
Retroalimentación de usuarios	Recopilar comentarios de usuarios finales para el informe.	Baja
Elaboración de tablas del informe	Elaborar tablas de backlog, calendario y tareas del sprint.	Baja

Sprint Backlog

Tareas a realizar

Tarea	HU	Descripción Detallada	Horas	SP	Responsable	Fecha
BD: corregir schemas de evento y notificación	HU-13 / HU-18 / HU-10	Añadir título a evento; agregar título, tipo ENUM y fecha_creacion a notificación; agregar leida a persona_notificación. Actualizar 01_schema.sql y 02_seeds.sql.	2h	2	Diego Calderón	30/04/2026
UI/UX: sistema de diseño — variables CSS globales	HU-01 / HU-14	Definir en index.css variables de color, tipografía, espaciado, radios y sombras. Actualizar clases utilitarias existentes. Prerequisito de todos los refactorios UI.	3h	2	Diego Calderón	30/04/2026
Fix: ampliar duración JWT y manejar sesión expirada	HU-24 / HU-26	Backend: JWT_EXPIRES_IN a 24h. Frontend: crear apiFetch en utils/api.ts que detecte 401, muestre mensaje y redirija a /login limpiando localStorage. Reemplazar fetch() directos existentes.	4h	3	Diego Calderón	02/05/2026
UI/UX: estilos de formularios consistentes	HU-01 / HU-14 / HU-19	Crear Form.module.css con estilos unificados para input, select, textarea, label y mensajes de error. Aplicar en formularios de Reservas, Grupos y evento.	2h	2	Diego Calderón	04/05/2026
Elaboración de tablas para el informe	HU-00	Elaborar las tablas del informe del Sprint 3: product backlog, sprint backlog, historias de usuario seleccionadas, lista de tareas con prioridad y calendario del sprint.	3h	2	Miguel Rosas	08/05/2026
Backend: CRUD de eventos	HU-13 / HU-18	Crear evento.controller.ts y evento.routes.ts. GET /api/eventos (filtrado por encargado_id con JOIN a reserva y espacio), GET /api/eventos/:id, PUT /api/eventos/:id, DELETE /api/eventos/:id.	4h	4	Pedro Caso	02/05/2026
Backend: modificar POST /api/reservas para crear evento asociado	HU-13 / HU-18	Modificar POST /api/reservas para aceptar título y descripción. Insertar evento con encargado_id = req.user.id en transacción SQL (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK).	3h	3	Pedro Caso	04/05/2026
Frontend: página "Mis Reservas" con eventos del usuario	HU-17 / HU-29	Crear EventosPage.tsx (ruta /mis-reservas) consumiendo GET /api/eventos. Tabla con: título, descripción, espacio, fecha, hora y badge de estado. Añadir ruta en App.tsx y link en Navbar.	3h	3	Pedro Caso	05/05/2026
Fix + Rediseño: Dashboard con visibilidad por rol	HU-01 / HU-14	Aplicar renderizado condicional por rol_id. Renovar layout: stat cards con íconos SVG, accesos rápidos como grid de tarjetas usando variables CSS.	4h	3	Javier Alvarado	03/05/2026

Fix: ocultar botones de escritura según rol	HU-01 / HU-08	Aplicar lógica puedeEditar en ListaGrupos y EspacioDetallePage usando rol_id de localStorage, consistente con los roles autorizados en el backend.	2h	2	Javier Alvarado	04/05/2026
Retroalimentación de usuarios para el informe	HU-00	Mostrar el incremento del Sprint 3 a usuarios finales y/o product owner. Recopilar comentarios, evidencias fotográficas de la socialización e incluirlos en el informe del sprint.	3h	2	Javier Alvarado	08/05/2026
Extracción de gráficos Burndown y métricas del sprint	HU-00	Recopilar datos de tiempo, generar gráfico Burndown del Sprint 3, calcular velocidad, calcular indicador de éxito con fórmula del Sprint 2 e incluirlos en el informe de gestión.	2h	1	Javier Alvarado	09/05/2026
Frontend: Página 404 integrada al router	HU-25	Crear NotFoundPage.tsx con mensaje claro e ícono. Reemplazar catch-all en App.tsx. Accesible sin autenticación.	1h	1	Miguel Rosas	30/04/2026
Fix: ocultar botones de escritura según rol	HU-01 / HU-08	Aplicar lógica puedeEditar en ListaGrupos y EspacioDetallePage usando rol_id de localStorage, consistente con los roles autorizados en el backend.	2h	2	Miguel Rosas	02/05/2026
UI/UX: refactorizar módulo Reservas a CSS Modules	HU-01 / HU-14	Migrar inline styles de ReservasPage.tsx, CrearReservaForm.tsx y ListaReservas.tsx a archivos .module.css usando variables CSS. No cambiar lógica.	3h	2	Diego Calderón	04/05/2026
Backend: endpoint GET /api/espacios con disponibilidad por fecha	HU-29	Ampliar endpoint de espacios para aceptar parámetros opcionales fecha, hora_inicio y hora_fin, devolviendo si cada espacio está disponible o reservado en ese horario.	3h	3	Miguel Rosas	05/05/2026
UI/UX: refactorizar módulo Tareas y Ministros a CSS Modules	HU-01 / HU-06 / HU-08	Migrar inline styles de TareasPage.tsx, CrearTareaForm.tsx, AsignarTareaForm.tsx, ListaAsignaciones.tsx y MinistrosPage.tsx a archivos .module.css usando variables CSS.	3h	2	Hugo Méndez	03/05/2026
UI/UX: refactorizar módulo Grupos a CSS Modules	HU-01 / HU-14	Migrar inline styles de gruposPage.tsx, CrearGrupoForm.tsx, EditarGrupoForm.tsx y ListaGrupos.tsx a archivos .module.css usando variables CSS. No cambiar lógica.	3h	2	Hugo Méndez	04/05/2026
Frontend: ampliar formulario de reserva con datos del evento	HU-13 / HU-18	Añadir campos titulo y descripcion a CrearReservaForm.tsx. Incluirlos en el POST. Actualizar validación local.	2h	2	Hugo Méndez	05/05/2026
Backend: validación de conflicto de horario en reservas	HU-16	Antes de insertar una reserva, verificar que no exista otra reserva aprobada para el mismo espacio en el mismo rango horario. Devolver	3h	3	Hugo Méndez	06/05/2026

Revisión y corrección de errores del software	HU-01 / HU-02 / HU-13	error 409 con mensaje claro si hay conflicto.	4h	2	Hugo Méndez	08/05/2026
		Revisión integral del sistema: verificar flujos críticos (login, reserva, aprobación, eventos), corregir errores visuales o funcionales encontrados durante el sprint, validar que los fixes de rol operan correctamente en todos los componentes.				

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas Planificadas	Responsable	SP	Horas
30 de Abril	Corrección de schemas, sistema de diseño CSS, página 404	Diego Calderón / Miguel Rosas	5	6
02 de Mayo	CRUD de eventos, JWT y sesión expirada, ocultar botones por rol	Diego Calderón / Pedro Caso / Javier Alvarado / Miguel Rosas	12	13
03 de Mayo	Dashboard por rol, refactor módulo Tareas y Ministros	Javier Alvarado / Hugo Méndez	5	7
04 de Mayo	Refactor formularios, reservas, grupos y POST reservas-eventos	Diego Calderón / Pedro Caso / Miguel Rosas / Hugo Méndez	9	11
05 de Mayo	Mis Reservas, disponibilidad de espacios, ampliación formulario reservas	Pedro Caso / Miguel Rosas / Hugo Méndez	8	8
06 de Mayo	Validación de conflictos de horario	Hugo Méndez	3	3

Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
DEV-44	BD: corregir schemas de evento y notificación	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-45	UI/UX: sistema de diseño — variables CSS globales	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-46	Fix: ampliar duración JWT y manejar sesión expirada	Diego Calderón	3	Finalizada
DEV-47	UI/UX: estilos de formularios consistentes	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-48	Elaboración de tablas para el informe	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-49	Backend: CRUD de eventos	Pedro Caso	4	Finalizada
DEV-50	Backend: modificar POST /api/reservas para crear evento asociado	Pedro Caso	3	Finalizada
DEV-51	Frontend: página “Mis Reservas” con eventos del usuario	Pedro Caso	3	Finalizada
DEV-52	Fix + Rediseño: Dashboard con visibilidad por rol	Javier Alvarado	3	Finalizada
DEV-53	Fix: ocultar botones de escritura según rol	Javier Alvarado	2	Finalizada
DEV-54	Retroalimentación de usuarios para el informe	Javier Alvarado	2	Finalizada
DEV-55	Extracción de gráficos Burndown y métricas del sprint	Javier Alvarado	1	Finalizada
DEV-56	Frontend: Página 404 integrada al router	Miguel Rosas	1	Finalizada
DEV-57	Fix: ocultar botones de escritura según rol	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-58	UI/UX: refactorizar módulo Reservas a CSS Modules	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-59	Backend: endpoint GET /api/espacios con disponibilidad por fecha	Miguel Rosas	3	Finalizada
DEV-60	UI/UX: refactorizar módulo Tareas y Ministros a CSS Modules	Hugo Méndez	2	Finalizada
DEV-61	UI/UX: refactorizar módulo Grupos a CSS Modules	Hugo Méndez	2	Finalizada

DEV-62	Frontend: ampliar formulario de reserva con datos del evento	Hugo Méndez	2	Finalizada
DEV-63	Backend: validación de conflicto de horario en reservas	Hugo Méndez	3	Finalizada
DEV-64	Revisión y corrección de errores del software	Hugo Méndez	2	Finalizada
Total de puntos realizados			48	

Tareas en Proceso


Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas


Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Métricas del Sprint

Burndown Chart

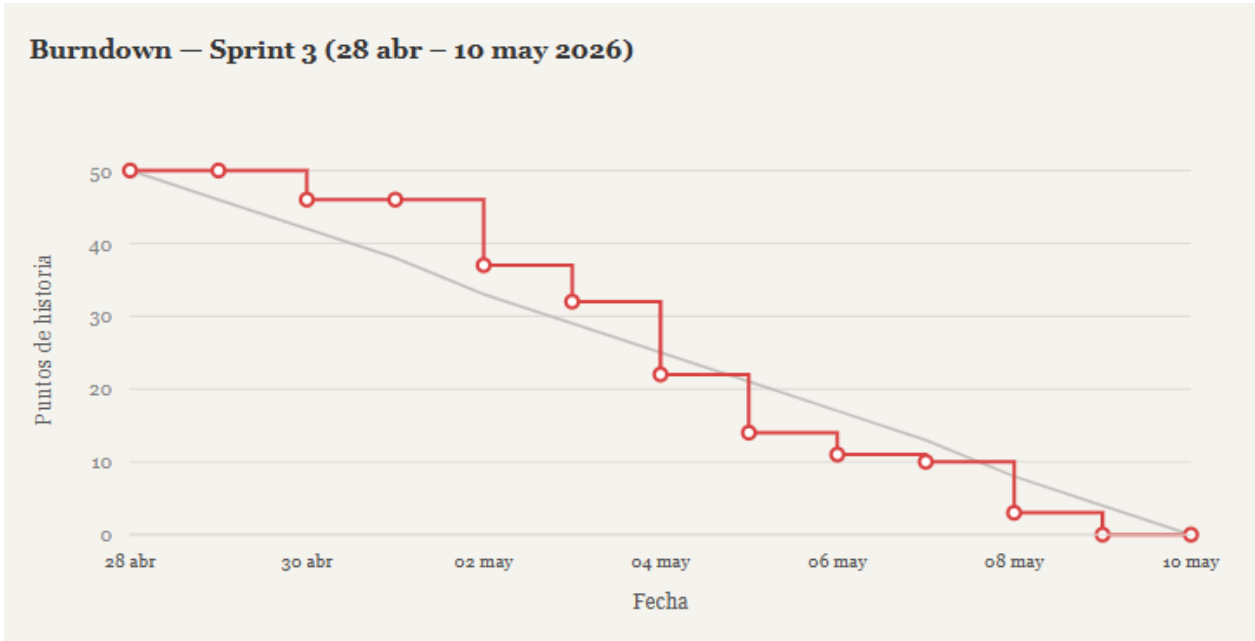


Velocity Chart

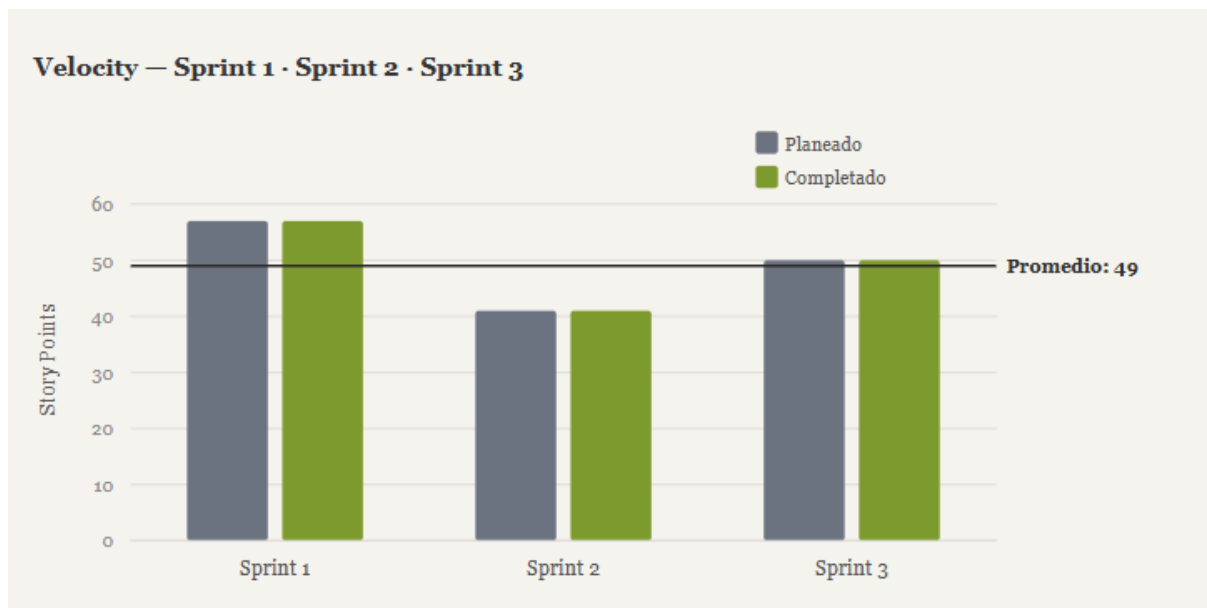


Muestra de Incremento a Product Owner

Diseño Anterior


Dashboard

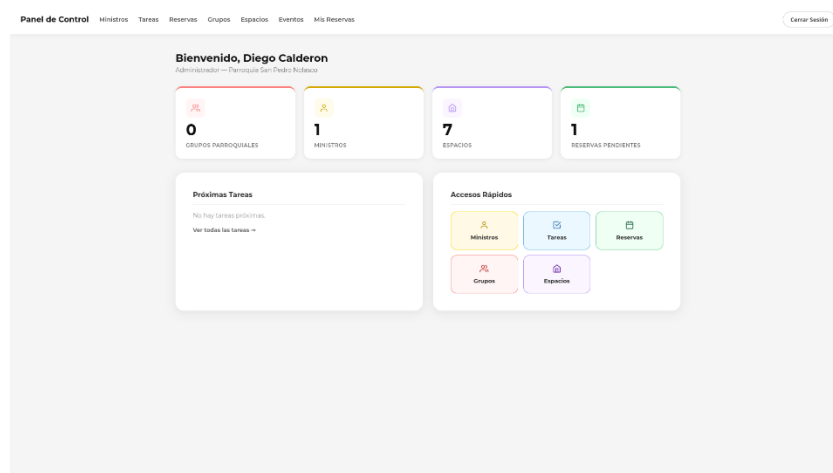


Espacios

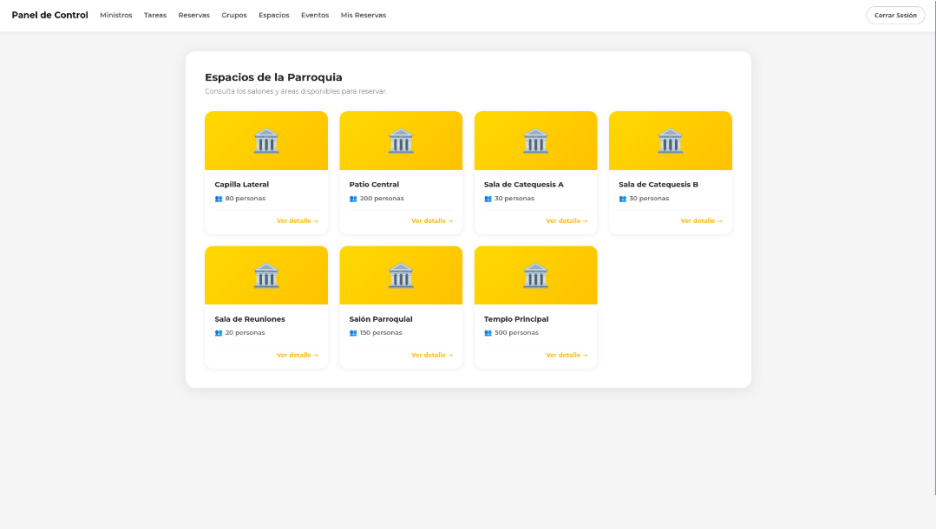

Eventos

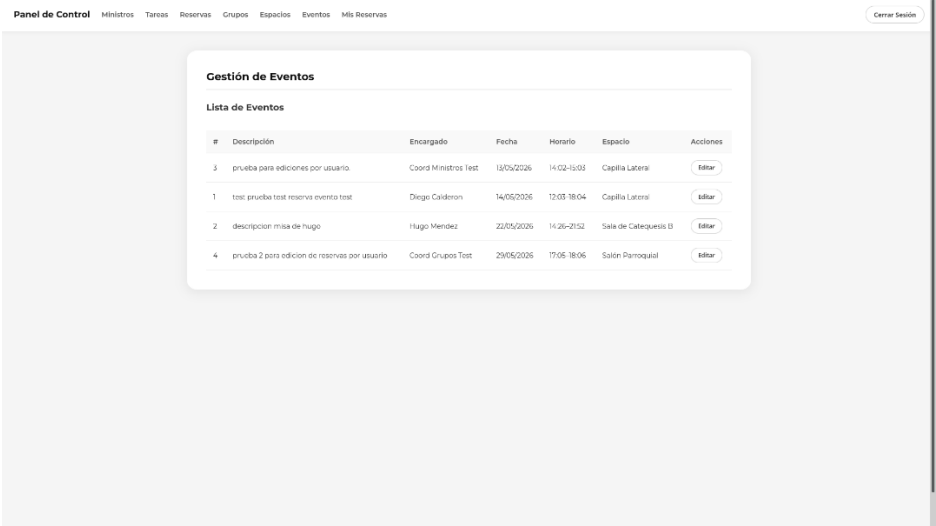

Grupos

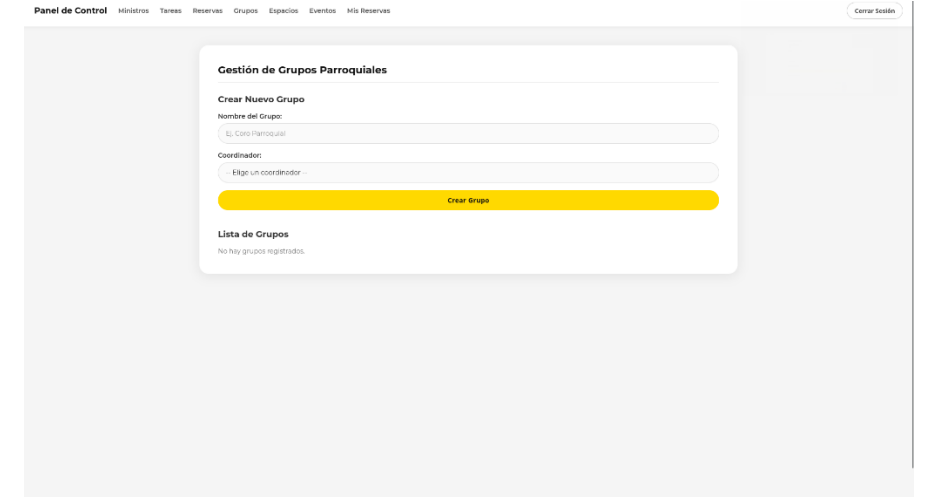

Login

Hola de Nuevo!

Email Address

Password

Login

Forgot Password

Ministros

Panel de ControlMinistrosTareasReservasGruposEspaciosEventosMis ReservasCerrar Sesión

Ministros

Nombre	Correo
Ministro Test	ministro@perroquita.com

Mis reservas

Panel de ControlMinistrosTareasReservasGruposEspaciosEventosMis ReservasCerrar Sesión

Mis Reservas

1Pendientes

0Confirmadas

0Rechazadas

#	Evento	Espacio	Fecha	Horario	Estado
1	test prueba test reserva evento test	Capilla Lateral	11/05/2025	12:00-18:04	Pendiente

Reservas

Panel de Control

Ministros

Tareas

Reservas

Grupos

Espacios

Eventos

Mis Reservas

Cerrar Sesión

Gestión de Reservas

Solicitar Reserva

espacio*

Selecciona un espacio

Fecha*

dd/mm/aaaa

hora de inicio*

hora de fin*

Titulo del Evento*

Misa del Día de la Madre

Descripción del Evento*

Celebración en honor a la Virgen, con canto y procesión

Solicitar Reserva

Lista de Reservas

#	Espacio	Fecha	hora inicio	hora fin	Titulo del Evento	Descripción	Estado	Acciones
3	Capilla lateral	13/05/2026	14:00	15:00	misa de coordinador de ministros	prueba para ediciones por usuario.	Confirmada	Editar
1	Capilla lateral	14/05/2026	15:00	16:04	Misa de prueba TEST edición	test prueba test reserva evento test.	Pendiente	ActualizarRechazarEliminar

Tareas

Panel de Control

Ministros

Tareas

Reservas

Grupos

Espacios

Eventos

Mis Reservas

Cerrar Sesión

Gestión de Tareas

Crear Nueva Tarea

Descripción

Limpieza de altar

Fecha

dd/mm/aaaa

hora de inicio

hora de fin

Crear Tarea

Asignar Tarea a Ministro

Seleccionar Tarea

Elige una tarea

Seleccionar Ministro

Elige un ministro


Guardar Asignación

Asignaciones Actuales


No hay tareas asignadas en este momento.

Rediseño


Dashboard

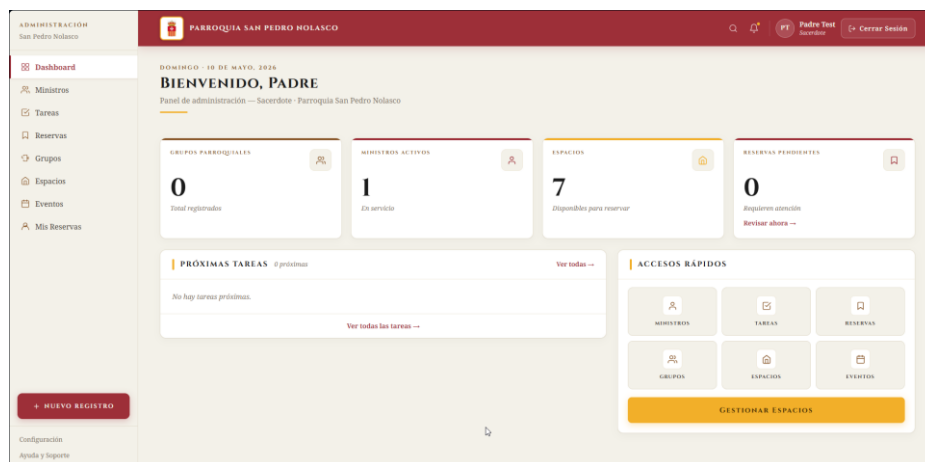

Espacios

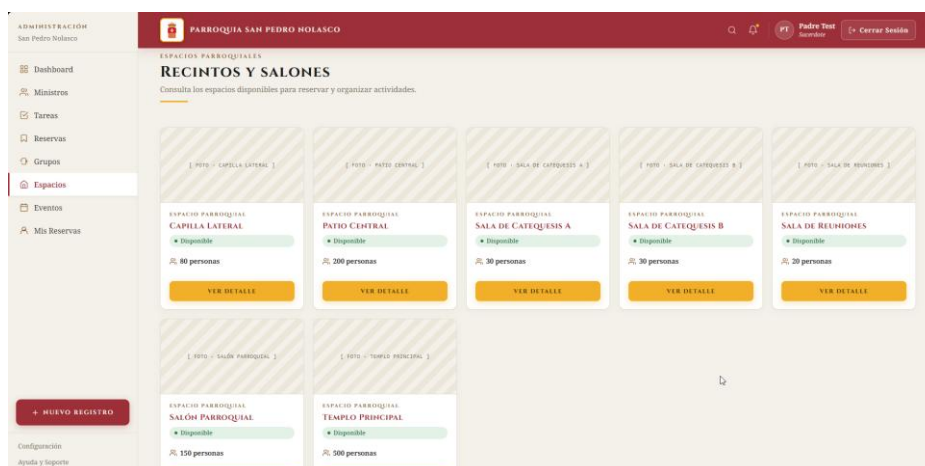

Eventos

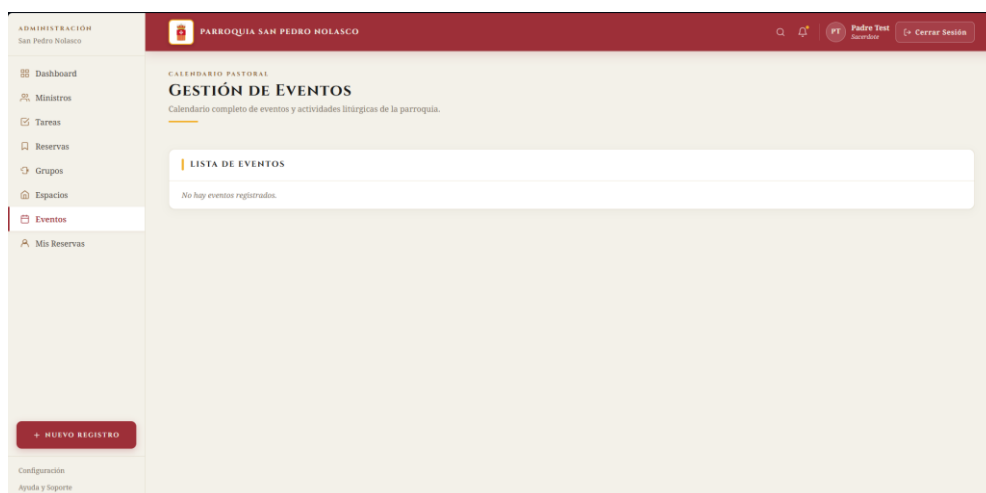

Grupos

ADMINISTRACIÓN
San Pedro Nolasco

PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

CONTENIDOS
GESTIÓN DE GRUPOS PARROQUIALES
Organiza los grupos pastorales y comunidades de la parroquia.

CREAR NUEVO GRUPO

CREAR NUEVO GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO:
Ej. Coro Parroquial

COORDINADOR:
- Elige un coordinador -

CREAR GRUPO

LISTA DE GRUPOS

No hay grupos registrados.

+ NUEVO REGISTRO

Configuración
Ayuda y soporte

Login

PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

BIENVENIDO DE NUEVO

LA CASA DEL SEÑOR, AHORA TAMBIÉN DIGITAL.

Plataforma administrativa para la gestión de ministros, tareas parroquiales, reservas de espacios y eventos litúrgicos de la comunidad.

© 2018 Parroquia San Pedro Nolasco - Comunidad

ACCESO ADMINISTRATIVO
HOLA, DE NUEVO
Ingresa tus credenciales para continuar.

CORREO ELECTRÓNICO
usuario@parroquia.com

CONTRASEÑA
[Oculto]

¿Olvidaste tu contraseña?

INICIAR SESIÓN

¿Necesitas una cuenta? Solicítala al administrador parroquial.

Ministros

ADMINISTRACIÓN
San Pedro Nolasco

PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

DIRECTORIO
MINISTROS Y PERSONAS
Directorio de ministros y voluntarios de la parroquia.

DIRECTORIO 1 personas

NOMBRE	CORREO	ROL
Ministro Test	ministro@parroquia.com	MINISTRO


+ NUEVO REGISTRO

Configuración
Ayuda y soporte


Mis reservas

Reservas

Tareas

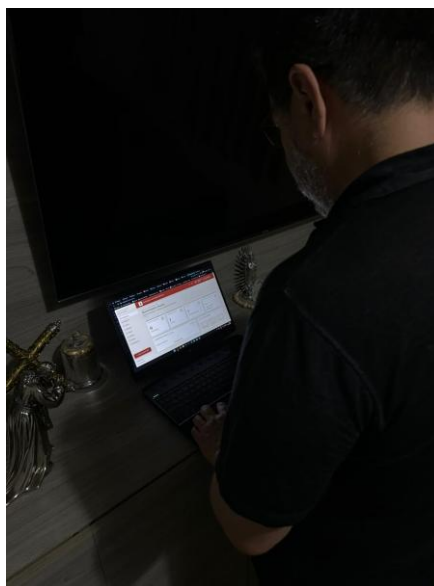Product owner 1

La vista es agradable y amigable. Una paleta de colores correcta que combina con los colores de la Orden de La Merced.

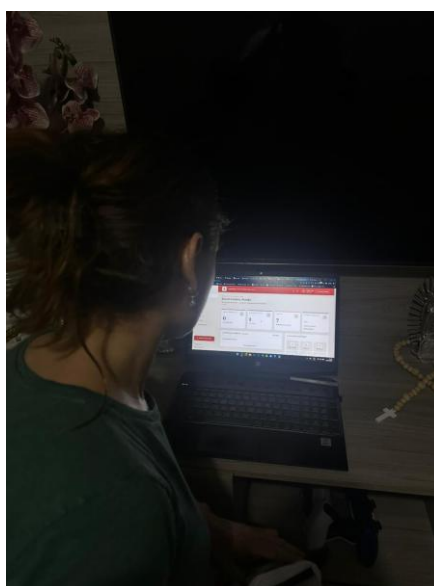Product owner 2

Me gusta la nueva vista, los colores de la Parroquia, se ve más llamativo y ordenado.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo logró completar el 100% de las tareas planificadas dentro del período del sprint, manteniendo el nivel de cumplimiento total alcanzado en sprints anteriores. Las medidas tomadas al inicio del sprint dieron resultados concretos: la comunicación entre integrantes mejoró notablemente, lo que permitió coordinar con mayor fluidez las tareas de integración entre backend y frontend, especialmente en los módulos de reservas y eventos. La refactorización del sistema de diseño mediante CSS Modules y variables globales unificó la identidad visual de la aplicación y redujo la deuda técnica acumulada en sprints anteriores. La implementación del CRUD de eventos y la validación de conflictos de horario se completaron de forma coordinada, evidenciando una mejor estimación de las tareas de integración.

Aspectos negativos

A pesar de la mejora en comunicación, la distribución de tareas presentó nuevamente una concentración de entregas hacia la segunda mitad del sprint (2-9 de mayo), con pocos avances registrados en los primeros días (28-29 de abril), lo que generó presión en los días finales. Algunas tareas de refactorización de UI/UX fueron más costosas de lo estimado, ya que implicaron revisión transversal de múltiples módulos de forma simultánea. Además ciertas historias de usuario requirieron ajustes durante la ejecución del sprint, lo que indica que la fase de refinamiento previa al sprint puede mejorarse.

Lean UX Canvas

Proceso Completo

Lean UX Canvas

Title: Lean UX Grupo 3 Parroquia San Pedro Nolasco	Date: Iteration:
---	---------------------

Problema del negocio

What business have you identified that needs help?

Nuestra plataforma administrativa fue diseñada para mejorar la organización y productividad de la Parroquia San Pedro Nolasco. Hemos observado mediante entrevistas/experiencias realizadas a miembros de la parroquia que los métodos actuales no son los más efectivos para alcanzar estos objetivos por lo que está causando extensos periodos de trabajo para la organización y problemas de comunicación dentro de la parroquia.

¿Cómo podríamos mejorar la plataforma administrativa para que nuestros clientes sean más exitosos determinado por los feedbacks de los miembros de la parroquia?

Usuarios y Clientes

¿En qué tipos de usuarios y clientes deben centrarse primero?

Parroquia (Coordinador de ministros)

- Quiénes se ocupan en sus días de semana y festivos de la Parroquia
- Organizar los horarios de los ministros
- Mantener la agenda
- Entender la necesidad de la parroquia

Miembros (Coordinador de ministros)

- Realizar la asistencia de los ministros de la parroquia
- Mantener la agenda de los ministros de la parroquia
- Entender la necesidad de la parroquia

- Quiere poder organizar de forma efectiva y sencilla a los ministros de la iglesia
- Quiere tener una plataforma en la que se centralice la información administrativa de la iglesia
- Quiere que la plataforma sea capaz de administrar y coordinar tareas de manera automatizada y sencilla

- Quiere enter las actividades en los horarios de la parroquia
- Quiere que sea sencilla la información de los ministros
- Quiere el control de los horarios de los ministros
- Quiere que el sistema sea de personas que estén en el grupo
- Quiere que el sistema sea los horarios que sean en un solo lugar

Ideas de solución

Enumera ideas de productos/características/mejoras que ayuden a tu público objetivo a lograr los beneficios que buscan

La visualización de tareas, mediante un calendario para uso de los ministros

El uso de una plataforma administrativa para poder gestionar los horarios de los ministros para organizar los tareas, automáticamente

La solución radica en un sistema compuesto de varias partes que permitan la organización, centralización, acceso a información y automatización de procesos técnicos simultáneamente desde un mismo lugar, permitiendo a los diferentes personal, dentro de la parroquia, desempeñar acciones personalizadas según su rol dentro de la misma.

Outcomes del negocio

¿Qué cambios en el comportamiento del cliente indicarían que ha resuelto un problema real de una manera que agregue valor?

Nuestra plataforma busca centralizar en un mismo lugar la actividad de gestión para el desarrollo de los procesos administrativos de la parroquia, de esta manera se evita la duplicación de esfuerzos y se optimiza el tiempo de respuesta de los ministros, para poder gestionar los horarios de los ministros, de manera automática y sencilla.

Nuestra plataforma busca centralizar los tareas administrativas de la parroquia, esto se puede medir con los tiempos que la toman a los coordinadores organizar los tareas.

Nuestra plataforma busca centralizar la información de la iglesia, esto se puede medir con los tiempos que la toman a los ministros de la parroquia, para poder gestionar los horarios de los ministros, de manera automática y sencilla.

Beneficio a los usuarios / clientes

¿Cuáles son los objetivos que intentan alcanzar sus usuarios? ¿Qué los motiva a buscar su solución?

1. Los usuarios invierten menos tiempo asignando los horarios y tareas de los ministros.
2. Los usuarios tienen mayor control sobre las reservas de salones dentro de la Iglesia.
3. Los usuarios si cumplen con los horarios asignados gracias a las notificaciones del sistema.

¿qué están tratando de lograr por si mismos?

Por qué buscarían nuestro producto o servicio?

Un manejo eficiente de la información.

Proteger información, evitar eventos de manera efectiva para los participantes.

Controlar los actividades, poder administrar los horarios de los ministros.

Los usuarios quieren una herramienta que les permita tener un control efectivo de la información administrativa de la iglesia.

Los usuarios quieren una herramienta que les permita tener un control efectivo de la información administrativa de la iglesia.

Los usuarios quieren una herramienta que les permita tener un control efectivo de la información administrativa de la iglesia.

[illegible]

Lienzo Estrategico

Lienzo de estrategia de producto

Visión del Producto

● Estrategia de Negocio
 Digitalizar la administración de la fe para que los líderes se enfoquen en la comunidad, no en el papeleo.

● Product Goal
 Eliminar el 100% de las reservas duplicadas y reducir el tiempo de planificación en un 50% para el primer trimestre.

● Métricas basadas en el Valor
 Nuestra métrica principal es el tiempo liberado para los coordinadores, medido por la rapidez en la asignación de tareas vs el método manual previo.

● Resultados Claves
 Los usuarios cumplen con los horarios gracias a las notificaciones automáticas del sistema.

● Clientes
Coordinador de Ministros: Necesita organizar el servicio de las personas a su cargo. Su principal frustración es la comunicación dispersa y el olvido de turnos.
Coordinadora de Grupos: Su prioridad es la logística de espacios físicos. Tiene las reservas duplicadas y los conflictos de horarios entre grupos.
Sacerdote: El "dueño del negocio". Necesita supervisar todo sin involucrarse en el micro-manejo, aprobando solicitudes con un solo clic.

● Valor al Usuario
 Tranquilidad al evitar conflictos de horarios y mayor control sobre las reservas de salones.

● Sprint Goal
Específico y Medible
 Una plataforma administrativa centralizada e inteligente que integra la gestión de espacios físicos y la asignación de tareas pastorales, garantizando la integridad de los datos mediante validaciones automáticas.

● Sprint Goal
Específico y Medible
 Elimine la duplicidad de reservas de salones y la desorganización en las tareas de los ministros, resolviendo la falta de comunicación y los conflictos de horarios que afectan la productividad de la parroquia.

● Sprint Goal
Específico y Medible
 Considerar la robustez del sistema mediante la validación técnica de conflictos de horario, asegurar la estabilidad del despliegue en contenedores y refinar la experiencia de usuario para garantizar una gestión administrativa sin errores.

● Posibles opciones de solución
 Motor de Validación de Disponibilidad
 Módulo de Reportes y Estadísticas
 UX de Reservas de Alta Fidelidad

● Hipótesis
 Creemos que la eliminación del problema de reservas duplicadas y la optimización del tiempo de gestión se logrará si los coordinadores y el sacerdote alcanzan un control visual y centralizado de los recursos con una plataforma administrativa basada en roles que incluya un calendario automatizado de tareas y validación de espacios en tiempo real.

Medidas a tomar para el Sprint 4

- Distribuir las tareas de forma más uniforme a lo largo del sprint, evitando la concentración de entregas en los últimos días.
- Establecer sesiones cortas de refinamiento al inicio del sprint para revisar y validar las historias de usuario antes de comenzar el desarrollo.
- Continuar fortaleciendo las pruebas de integración entre módulos de frontend y backend para detectar incompatibilidades de forma temprana.
- Mantener el estándar de diseño establecido con el sistema de CSS Modules y variables globales en todos los módulos nuevos que se desarrollen.
